



NION EUROPEENNE



**ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN**

**Centre Technique de la Forêt Communale**

**BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN**

**Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : [ctfccameroun@yahoo.com](mailto:ctfccameroun@yahoo.com)**

**Site web : [www.foretcommunale-cameroun.org](http://www.foretcommunale-cameroun.org)**



**REPUBLIQUE DU CAMEROUN**

**Paix – Travail – Patrie**

\*\*\*\*\*

**REGION DU NORD**

\*\*\*\*\*

**DEPARTEMENT DE LA BENOUE**

\*\*\*\*\*

**COMMUNE DE LAGDO**

\*\*\*\*\*

**REPUBLIC OF CAMEROON**

**Peace-Work-Fatherland**

\*\*\*\*\*

**NORTH REGION**

\*\*\*\*\*

**BENUE DIVISION**

\*\*\*\*\*

**LAGDO COUNCIL**

\*\*\*\*\*

## **RAPPORT ANNUEL**

# **PROJET REBOISEMENT 1400 DANS LA COMMUNE DE LAGDO ( Bengui) Période : Janvier à Décembre 2019**



**Ce projet est financé par  
l'Union Européenne**

**Ce projet est mis en œuvre  
par le Centre Technique de  
la Forêt Communale**

## TABLE DES MATIERES

LISTE DES PHOTOS.....	4
CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION .....	5
1. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION .....	5
2. Rappel des activités prévus pour L'ANNEE .....	5
I. REBOISEMENT DE 200 HECTARES DANS LE MASSIF FORESTIER DE OURO- DOUKOUDJE.....	6
I.1. DELIMITATION ET MATERIALISATION DU SITE RETENU POUR LE REBOISEMENT ...	6
I.1.1. Réalisation de la carte du site.....	7
I.1.2. Réunion de sensibilisation des populations de Bengui sur les enjeux du projet .....	8
I.1.3. Suivi des travaux de la pépinière de Bengui et celle de la commune .....	8
I.1.4. Défrichage de espaces retenus.....	9
I.1.5. Confection des piquets .....	9
I.7. Paiement des opérations de défrichage.....	10
I.2. OPERATION DE TROUAISSON DANS LE SITE DE LA FORET COMMUNALE .....	10
I.2.1. Confection des trous .....	10
I.2.2. Suivi des activités sur le terrain.....	11
I.2.3. Paiement des opérations de trouaïsson .....	11
I.2.4. Sensibilisation des parties prenantes sur la promotion des droits et l'égalité entre les hommes et les femmes.....	12
I.3. OPERATION DE MISE EN TERRE DES PLANTS.....	13
I.3.1. Formation sur les techniques de reboisement.....	13
I.3.1.1. Phase théorique .....	13
I.3.1.2. Phase pratique.....	14
I.3.2. Transport des plants vers les espaces à, reboisés .....	14
I.4. Mise en terre des plants.....	15
I.4.1. Paiement des opérations de mise en terre des plants.....	16
II.1. Confection des tenues de gardiens .....	16
II.2. Etrentien de plants mise en terre .....	17
II.3. Sensibilisation des populations sur les feux-de brousse et la divagation du bétail.....	17

II.4. Mise en place des pare-feux.....	18
III. OPERATION D'ARROSAGE DE REGARNI ET DE TRAITEMENT DES PLANTS.....	19
III.1. Construction de 05 points d'eau artisanaux.....	19
III.2. Opération d'arrosage des plantes.....	19
III.3. Traitement des plants.....	20
III.4. Opération de regarni.....	20
III.5. Suivi des opérations sur le terrain.....	21
III.6. Opération d'arrosage des plantes.....	21
III.7. Traitement des plants.....	22
III.8. Opération de regarni.....	22
III.9. Suivi des opérations sur le terrain.....	22
IV. REBOISEMENT DE LA BERGE OUEST DU LAC DE LAGDO A OURO-TCHAIDO.....	23
IV.1. Réunion de sensibilisation des populations sur reboisement 1400.....	23
IV.2. Mot du Chef du village de Ouro-Tchaido.....	23
IV.3. Opération de trouaison.....	24
IV.4. Transport et manutention des plants.....	24
IV.5. Mise en terre des plants.....	25
IV.6. Destruction des sachets plastiques.....	26
IV.7. Paiement des opération de trouaison et de mise en terre des plants.....	27
IV.8. Divagation du bétail sur les espaces reboisés.....	27
V. Difficultés rencontrées.....	28
VI. Solutions envisagées.....	28

## LISTE DES PHOTOS

Photo 1: Délimitation et matérialisation des espaces .....	7
Photo 2: Sensibilisation des populations à Bengui.....	8
Photo 3: Vue de la pépinière d'anacarde à Bengui .....	9
Photo 4: Apperçu des travaux de défrichage sur le terrain .....	9
Photo 5: Paiement des opérations de piquetage .....	10
Photo 6: Sensibilisation des populations sur le reboisement de la berge .....	23
Photo 7: Confection des trous .....	24
Photo 8: Manutention et transport des plants auprès des pépiniéristes privés .....	25
Photo 9: Destruction des sachets .....	26
Photo 10: Paiement des opérations de reboisement .....	27
Photo 11: Saisie des chaèvres en divagation dans les espaces reboisés .....	27

## CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR<sup>1</sup>, qui s'articule autour de l'APVFLEGT<sup>2</sup>. Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Lagdo et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, les opérations de reboisement de 200 hectares dans la localités de Bengui et de renforcement des espaces reboisés le long de la berge Ouest du lac pour cette première année sont effectif sur le terrain.

### 1. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal est de reboiser 200 hectares du massif forestier de Ouro-Doukoudjé dans la localité de Bengui et 197 hectares le long de la berge dans la localité de Ouro-Tchaido pour la première année.

### 2. RAPPEL DES ACTIVITÉS PRÉVUS POUR L'ANNEE

N°	Activités	Responsables	Deadline
1.	Délimitation et matérialisation du site retenu pour le reboisement	Chargé du reboisement/Conseillers municipaux/Chef de village	Du 10 au 11/05/2018
2.	Réunion de sensibilisation des populations de Bengui sur les enjeux du projet	Chargé du reboisement/DAADER/Conseillers municipaux	Du 08 au 13/05/2018
3.	Suivre les travaux d'installation de la pépinière de Bengui	Chargé du reboisement/AFRICAN COMODITIES	Du 09 au 12/05/2018
4.	Travaux de défrichage des espaces retenus (200 hectares)	Chargé du reboisement/Communautés	Du 08 au 10/05/18
5.	Confection des piquets	Chargé du reboisement/Communautés	11/05/2018
6.	Paiement des opérations de défrichage	Chargé du reboisement	16/05/2018
7.	Lancement des opérations de piquetage	Chargé du reboisement	A définir
8.	Réunion de sensibilisation des pp sur le VIH/SIDA à Bengui	Point focal VIH/SIDA/Relais communautaire	17/05/2018

(i) <sup>1</sup> PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) <sup>2</sup> APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

N°	Activités	Responsables	Deadline
9.	Finalisation du TdR pour le reboisement de la berge Ouest du lac	Chargé du reboisement	20/05/2018
10.	Lancement des opérations de trouaison le long de la berge à Ouro-Tchaido	Chargé du reboisement	08/05/2018
11.	Suivi des opérations de transport des plants des pépinières vers le site à reboiser	Chargé du reboisement	09/05/2018
12.	Lancement effectif de la mise en terre des plants à Ouro-Tchaido	Chargé du reboisement	14/05/2018
13.	Paiement des opérations de reboisement de la berge	Chargé du reboisement	A définir après les travaux
14.	Finalisation des TDR Arrosage et entretiens des plants	Chargé du reboisement	
15.	Sécurisation et protections des plants mis en terre	Chargé du reboisement/DAADER/Conseillers municipaux	
16.	Mission de l'Union Européenne	Chargé du reboisement/UE/Commune	
17.	Opération d'arrosage et de traitement des plants	Chargé du reboisement/DAADER/Conseillers municipaux	
18.	Entretien et arrosage des plants des 197 ha des berges ouest du lac		

## I. REBOISEMENT DE 200 HECTARES DANS LE MASSIF FORESTIER DE OURO-DOUKOUDJE

### I.1. DELIMITATION ET MATERIALISATION DU SITE RETENU POUR LE REBOISEMENT

Du 23 au 27 Mars 2018 il a été organisé une mission en vue de la matérialisation et la délimitation des espaces retenus dans le cadre du projet reboisement 1400 dans la localité de Bengui situé au Sud du massif forestier de Ouro-Doukoudjé. Cette mission de terrain était supervisée par **M. PLONG Claude Yannick** assignant en qualité de Chargé du Reboisement 1400.

La mission sur l'état des lieux des sites à reboiser a débuté par une séance introductive à la chefferie de Bengui. Après avoir présenté les membres de la mission, le Chargé du Reboisement (chef de mission) a dans un premier temps situé le contexte de la mission, puis présenté les objectifs visés par la mission, notamment, la visite des espaces retenus pour le reboisement, la délimitation et la matérialisation des espaces, et enfin la réalisation de la carte et une évaluation des conditions physique et environnementale du site. Les échanges se sont poursuivis par la présentation du projet **REBOISEMENT 1400** en précisant que le projet est entièrement financé par l'Union Européenne à travers l'Association des Commune Forestière du Cameroun (ACFCAM) et accompagné techniquement par le Centre Technique de la foresterie Communale (CTFC). Aussi au cours de la mise en œuvre des activités, des réunions sensibilisations seront effectuées dans le village notamment sur la viabilité environnementale, le VIH/SIDA, la jeunesse, la démocratie, la gouvernance, l'égalité entre


l'homme et la femme etc. Après cet aperçu du projet le chef du village Bengui a désigné des facilitateurs endogènes pour la délimitation des espaces.



**Photo 1: Délimitation et matérialisation des espaces**

### **I.1.1. Réalisation de la carte du site**

L'élaboration de la carte du massif forestier de Ouro-Doukoudjé a été l'œuvre du chargé de reboisement du projet. De fait, le resultat de la carte de l'occupation du sol a permis de ressortir les espaces dégradés du massif en général et ceux de Bengui en particulier. Les images utilisées sont le Landsat 8 couplé aux images sentinelles. Les résultats montrent que la partie Sud de la carte (Bengui) est la zone plus touchée du massif d'où la l'implémentation du projet dans cet espace.

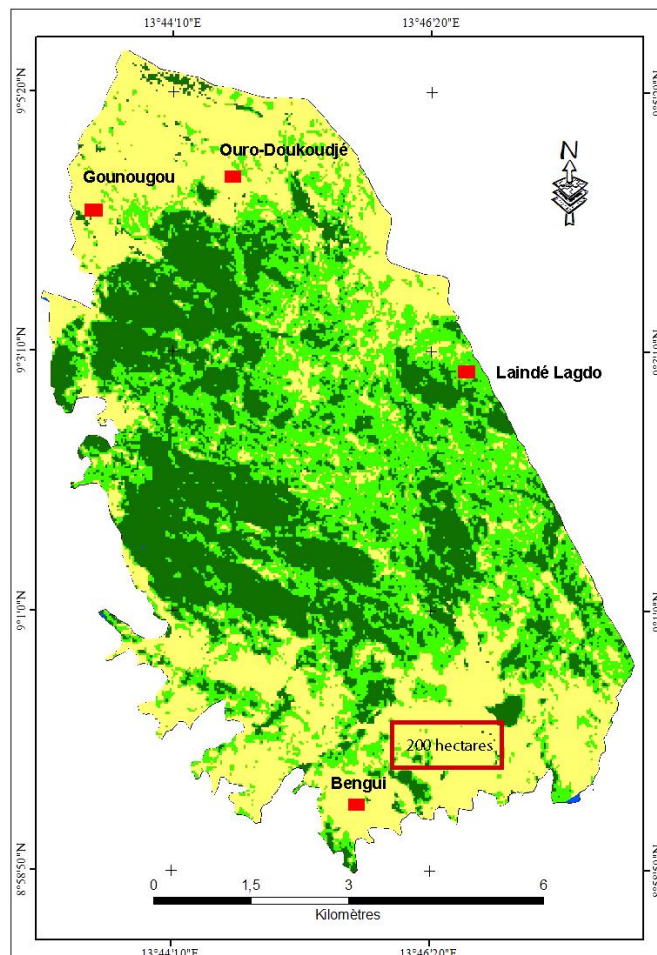



### **I.1.2. Réunion de sensibilisation des populations de Bengui sur les enjeux du projet**

Pour ce qui est des réunions de sensibilisation dans la localité de Bengui, quatre (04) assises ont été effectuées avec le concours du Délégué d'Arrondissement d'Agriculture de Lagdo, les Conseillers Municipaux de la localité concernée et le chef du village ceci, dans le but de sensibiliser les communautés sur les enjeux du projet et de lever les équivoques quant-au reboisement qui sera effectué dans leurs espaces de cultures.



**Photo 2: Sensibilisation des populations à Bengui**

Au terme de cette importante réunion, les populations de Bengui ont tous de façon unanime adhérees à l'idée de ce projet et ont salué les efforts consentis par le Maire de la commune M. MAMA Abakai mais aussi et surtout l'Union Européenne dans leur lutte pour l'amélioration des conditions de vie des communautés et la réduction de la pauvreté en milieu rural.

### **I.1.3. Suivi des travaux de la pépinière de Bengui et celle de la commune**

Les travaux de mise en place de la pépinière de Bengui ont débuté au mois de Mai avec une capacité de 35 000 plants. Ceci résulte du partenariat public-privé entre la commune de Lagdo et AFRICAN COMMODITIES. De fait, les travaux relatifs au remplissage de terre dans les pots ont également suivi et enregistré à ce jour 35 000 pots réalisés par l'équipe d'AFRICAN COMMODITIES. A cet effet 18 femmes et 06 jeunes ont été retenus pour les travaux et ont déjà perçus deux (02) rémunérations payées tous les deux semaines. Aussi, 15 000 autres pots ont été remplis de par l'équipe de la pépinière municipale en date du 27 Mai au 07 Juin 2019.





**Photo 3: Vue de la pépinière d'anacarde à Bengui**

#### **I.1.4. Défrichage de espaces retenus**

En date du 27 Mai 2019, les travaux de défrichage des 200 hectares retenus dans le cadre du projet ont effectivement démarrés. Trente huit (38) manœuvres constitué en majorité des femmes (76%) et des hommes (24%) ont pris part aux travaux. La méthodologie du travail était organisée par bloc de 5 ha à raison de 25 000 FCFA/bloc. Avant et après le début des travaux une liste de présence était dressée pour s'assurer de l'effectivité des manœuvres. Aussi, à la fin du défrichage d'un bloc, un contrôle systématique était effectué par le chargé du reboisement et le chef d'équipe du bloc avant sa validation. Au terme de la première semaine des travaux 135 hectares ont été défrichés. Cest au terme de la semaine suivante que les travaux de défrichage des 65 autres hectares ce sont terminés après la validation faite par le Chargé du Reboisement.



**Photo 4: Apperçu des travaux de défrichage sur le terrain**

#### **I.1.5. Confection des piquets**

La confection des piquets a démarré le 29 Mai 2019. A cet effet quatre (04) femmes ont été mobilisées. La taille ninimun retenue pour chaque piquet est 70 à 80 cm à raison de 25 F CFA/ piquet. Au terme de la première semaine, 11 835 piquets ont été confectionnés et les 8 165 autres piquets ont été finalisés la semaine d'après.





des piquets et les opérations de piquetage des 200 ha du projet Reboisement 1400 ont perçus un montant total 2 500 000 F CFA. Aussi les femmes qui représentaient la majorité ont reçus 1 876 450 F CFA et les hommes un montant de 623 550 F CFA.



**Photo 5: Paiement des opérations de piquetage et de défrichage**

## **I.2. OPERATION DE TROUAISON DANS LE SITE DE LA FORET COMMUNALE**

### **I.2.1. Confection des trous**

Durant le mois d’Août 2019, ce sont poursuivie les opérations de trouaisons des 200 ha de la Forêt Communale dans la commune de Lagdo. Cette opération a effectivement été bouclée le 27 Août 2019. De fait, les **200 hectares** retenus dans le cadre du projet ont été troués. Cette opération a été cofinancée par les fond de l’Union Européenne à travers l’Association des Communes Forestières du Cameroun et la commune de Lagdo.

**Tableau 1: Récapitulatif des opérations de trouaisons**

<b>Période</b>	<b>Superficies trouées (ha)</b>	<b>Nombre de trous creusés</b>	<b>Nombre de personnes recrutés</b>	<b>Nombre de femmes impliquées</b>
<b>Du 1er au 10/08/2019</b>	46	4 600	35	14
<b>Du 12 au 18/08/2019</b>	74	7 400	42	17
<b>Du 20 au 27/08/2019</b>	80	8 000	49	21
<b>Total</b>	<b>1 012</b>	<b>20 000</b>	<b>126</b>	<b>52</b>





### **I.2.2. Suivi des activités sur le terrain**

Aucours des activités de trouaison des 200 ha dans la Forêt Communale de Lagdo le Chargé du Resboisement **M. PLONG Claude Yannick** a effectué 11 descente sur le terrain. L'objectif de ses descentes était de se rassuer que les dimenssions des trous, l'implication des femmes dans les travaux et le pointage des manœuvres à la fin des travaux journalier. Aussi pendant les opérations, de trouaison, des messages d'information ont été passé au populationx en vue de la réunion de sensibilisation sur la promotion des droits et l'égalité en les hommes et les femmes.

### **I.2.3. Paiement des opérations de trouaison**

Après vérification et validation des opérations de trouaison, le Chargé du Reboisement a procédé au paiement des manœuvres. Ainsi un montant total de 2 000 000 F CFA ont été payé au manœuvres dans la localité de Bengui. Chaque chef de groupe constitué essentiellement

des femmes ont déchargé chacune leur argent en fonction du nombre de trous creusé et donc la fiche de décharge se trouve en annexe de ce rapport.



#### **1.2.4. Sensibilisation des parties prenantes sur la promotion des droits et l'égalité entre les hommes et les femmes**

En date du 26 au 28 Août 2019 avant l'atelier de sensibilisation des parties prenantes et le lancement officiel des opérations de mise en terre des plants, une réunion de sensibilisation des parties prenantes sur la promotion des droits et l'égalité entre les hommes et les femmes a été organisée par le représentant de l'Organisation de la Société Civile des droits et des libertés de la commune de Lagdo en la personne de HAMAN Roger. Au cours de cette réunion de sensibilisation, le formateur présenté son plan de travail structuré en 03 grands points qui ont été débatus sur les 03 jours à savoir :

1. La signification du vocable Droits de l'Homme et des Libertés et importance de Droits et de Libertés;
2. Droits et devoirs des citoyens, jeux et questions réponses ;
3. Quels sont les libertés fondamentales des hommes et des femmes, jeux et questions réponses.

Au cours de cette réunion, environ 45 participants étaient présent ce jours. On a aussi noté la présence du Délégué d'Arrondissement d'Agriculture, le chef du village et les conseillers municipaux concernés par la zone de mise en œuvre du projet. Cette réunion était généralement organisée en fin d'après midi pour la simple raison que la plupart des ménages rentraient des plantations à partir de 14 heures.





Au terme des opérations de trouaison de 200 hectares du massif forestier de Ouro-Doukoudjé, 20 000 trous ont été creusés. Plus 74 manœuvres ont pris part aux travaux sur le terrain dont 72% représentaient les femmes et 28 % pour les hommes. Aussi au terme de cette activité une personne ressource a réalisé une réunion de sensibilisation des populations sur la promotion des droits et l'égalité entre les hommes et les femmes. Environ 46 participants ont pris part à cette réunion.

### **I.3. OPERATION DE MISE EN TERRE DES PLANTS**

#### **I.3.1. Formation sur les techniques de reboisement**

En date du 1<sup>er</sup> Septembre 2019, le chargé de reboisement ainsi que l'équipe technique d'African Commodities ont organisé une formation des manœuvres sur les techniques de reboisement. Cette activité a été menée juste après les opérations de trouaison pour ainsi préparer les communautés à la mise en terre des 20 000 plants dans la Forêt Communale de Lagdo. La formation proprement dite a été organisée en deux parties dont une phase théorique dans la salle de l'école publique de Bengui et une phase pratique sur le terrain. Elle a vu la participation d'environ 45 participants dont 31 femmes et 14 hommes.

##### **I.3.1.1. Phase théorique**

Durant cette phase théorique dans la localité de Bengui, il s'agissait plus concrètement d'apprendre aux participants comment mettre en terre un plant qu'il soit forestier ou fruitier et les différentes étapes à respecter. Pendant plus de 2 heures, le chargé du reboisement est revenu sur les dimensions du trou pour qu'un plant forestier soit mis en terre, la hauteur maximale d'un plant (15 cm) et les produits à appliquer pour protéger la plante en cas d'attaque.



**Photo 6: Séance de formation à Bengui**

### **I.3.1.2. Phase pratique**

Après la phase théorique, les communautés se sont dirigées sur le site retenu pour une démonstration pratique. Le matériel requis pour cette phase pratique était constitué des plants d'anacardiens, des arrosoirs, du produit pour traitement des plants et des pelles. Après avoir passé en revue pour une seconde fois les étapes à respecter pour la mise en terre d'un plant, un participant a été choisi pour appliquer les enseignements reçus sous le regard des populations.



**Photo 3: Démonstration pratique dans le site de Ouro Kessoum**

### **I.3.2. Transport des plants vers les espaces à, reboisés**

Dans le cadre des opérations de mise en terre des plants, l'action portant sur le transport des plants consistait à transporter les plants de la pépinière jusqu'au site à reboiser sur une distance plus ou moins de 3 kilomètres. Ainsi 03 tricycles, 15 porte-tout et 05 brouettes ont été mis à contribution pour cette opération. Aussi 07 volontaires ont été retenus par le chargé du reboisement pour cette opération. De façon pratique, il s'agissait de transporter les plants un jour avant leur mise en terre et les déposer sur le site avec une moyenne de 2500 plants par jour. Au terme des 08 premiers jours de travail, 17 840 plants ont été transportés et déposés



sur les espaces à reboiser. Les 2 160 autres plants ont été transporté sur 03 jours d'affilé suis au pluie diluvienne enregistré au courant de la semaine.



#### I.4. MISE EN TERRE DES PLANTS

En ce qui concerne les opérations de mise en terre des plants environ 54 manœuvres volontaires ont été retenus pour cette opération et dont 43 femmes et 11 hommes. Les travaux étaient organisés sur le terrain en équipe de 05 à 08 manœuvres avec à la tête un chef de groupe. Une moyenne de 1200 plants étaient mis en terre par jour soit 250 à 300 plants mis en terre par groupe. Au cours de cette importante opération, le chargé du reboisement a effectué 21 descente de terrain relative au contrôle et au suivi des activités sur le terrain. Il a été accompagné au cours de cette opération par l'animateur communal AGIRAP et les conseillers municipaux de la localité concernées.







#### **I.4.1. Paiement des opérations de mise en terre des plants**

Au terme des opérations de mise en terre des plants dans la localité de Bengui, les manœuvres retenus pour les différentes activités (manutention et mise en terre des plants) ont été rémunérés pour l'ensemble des travaux memés. Les différents chefs de groupe ont reçus chacun en moyenne 150 000 F CFA



## **II. OPERATION DE PROTECTION D'ENTRETIEN ET DE SECURISATION DU SITE**

### **II.1. Confection des tenues de gardiens**

Dans le cadre des opération de sécurisation et de protection le Chargé du reboisement a procédé à la sélection de 05 gardiens. Ces derniers ont été retenus suivant les critères ci-après :

- Forte implication lors des activités
- Bonne connaissance du site de reboisement
- Avoir un CNI valide
- Etre en bonne santé ;



- Travailler 7J/7 pendant 06 mois

Après la sélection des volontaires, des équipements constitués des bottes, de machettes, de torches et des gilets ont été confectionné et remis à chacun d'entre eux. Les gardiens de la plantation d'anacarde dans la localité de Bengui ont été retenu pour une période de 06 mois moyennant une motivation mensuelle de 30 000 F CFA. Ils sont chargé de veiller à la protection des plants contre l'intrusion des bêtes et les feux de brousse dans les espaces reboisés. De même, ils sont tenus identifier les plants mort et faire parvenir au Chargé du Reboisement 1400 le nombre de plants morts retrouvés dans leurs zones d'intervention. Au terme des trois premier mois 2316 plants mort ont été enregistré et ont déjà fait l'objet de regarni aussi tôt identifié.



## II.2. Entretien de plants mise en terre

Ayant débuté après les opérations de mise en terre des 20 000 plants d'anacarde dans la localité de Bengui, le Chargé du Reboisement a retenu 43 volontaires donc 34 femmes et 09 hommes. Le travail a consisté à nettoyer les alentours de chaque plants sur une surface de 1m<sup>2</sup>. Au terme des 2 première semaine 15 200 plants ont été entretenus et les manœuvres ont perçu chancun une avance. Cest au terme de la dernière semaine que les opérations des plants ont été achevés après une vérification effectué par le Chargé du Reboisement.



d'arrondissement d'agriculture, le chef de poste forestier, l'animateur communal AGIRAP/PNDP et les conseillers municipaux des localités concernées une vaste campagne de sensibilisation des populations de Bengui sur les feux de brousse et la divagation du bétail sur les sites reboisés. Environ 65 participants ont pris part à ses assises ainsi que le chef du village et sa suite. Au terme de cette réunion, de nouvelles pistes à bétail ont été matérialisées à la peinture pour permettre au bétail d'éviter les espaces reboisés. Il a été demandé à cet effet à la population de tenir très loin les petits ruminants notamment les chèvres et les moutons. Et un communiqué a été dressé à cette occasion et contresigné par le Maire et le Sous-Préfet.



Pour ce qui est des feux de brousse un message fort a été donné par le chef du village qui a demandé au chasseur de gibier principal utilisateur de feux de brousse pour distraire le gibier d'exercer cette activité loin des espaces qui ont été reboisés.

#### **II.4. Mise en place des pare-feux**

Afin de lutter efficacement contre les feux de brousse dans la plantation d'anacarde mis en place dans le cadre du projet reboisement 1400 financé par l'Union Européenne à travers l'Association des Communes Forestières du Cameroun, 10 manœuvres ont été mobilisées pour cette grande activité. Il s'est agi de mettre en place deux pare-feux dont un externe et l'autre interne. Le pare-feu externe d'une emprise de 16 mètres de largeur permet d'éviter que le feu de brousse lancé par des personnes de mauvaise foi n'atteigne pas le site reboisé. De fait un pare-feu d'une surface de 924 m<sup>2</sup> carée a été mis en place sur une période de D'un mois et demi.



### III. OPERATION D'ARROSAGE DE REGARNI ET DE TRAITEMENT DES PLANTS

#### III.1. Construction de 05 points d'eau artisanaux

En date du 10 Novembre 2019, l'activité de construction des 05 points d'eau artisanaux a été lancée dans la localité de Bengui site de mise en œuvre du projet Reboisement 1400. Cette opération a été bouclée le 20 Novembre. De fait, les 05 points d'eau retenus pour l'arrosage des 200 hectares sur le site de Bengui ont été construits. A cet effet j'ai effectué 09 descentes sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité des travaux et collecter les coordonnées GPS des points d'eau construits. Par ailleurs, pendant les travaux, le spécialiste local des points d'eau artisanaux le nommé **BELDENA MATAKON Gérémi** a rencontré d'énormes difficultés. Certains points d'eau ne disposaient pas assez d'eau pour conduire les opérations d'arrosage. Il faut tout de même signaler que pendant la construction des 05 points d'eau on a enregistré 11 échecs liés à l'absence d'eau et la présence des rochers à quelques 3 mètres de profondeur.



#### III.2. Opération d'arrosage des plantes

Ayant débuté deux semaines après la mise en terre des plants, les opérations d'arrosage ont mobilisé deux grands groupes dont l'un constitué de 10 manœuvres volontaires et le second de 15 manœuvres volontaires. Au cours de cette opération 19 femmes et 06 hommes ont été retenus pour cette opération durant 06 mois allant de Septembre à Mars. Comme matériel de travail, un tricycle chargé d'une cuve de 10 000 litres assurait le ravitaillement en eau au niveau de chaque bloc. 05 motopompes assuraient l'extraction de l'eau à partir des différents points d'eau construits. Les manœuvres retenus étaient munis des bidons de 20 litres et des arrosoirs pour arroser les plantes. Cette opération d'arrosage se faisait 03 fois par semaine et allait de 06 heures du matin à 12 heures et reprenait à 15 heures pour boucler à 17 heures 30.

Au terme d'une journée de travail chaque manœuvre percevait par jour un montant de 2000 F CFA payé chaque fin du mois.



### **III.3. Traitement des plants**

Dans le but de faire face aux attaques contre les insectes, les termites et les criquets, nous avons lancé une vaste campagne de traitement des 20 000 plants d'anacarde mis en terre dans le site de Bengui. A cet effet le Délégué d'Arrondissement d'Agriculture et du Développement Rural de Lagdo et avec le concours de l'équipe technique d'African Commodities ont mis à notre disposition 05 personnes ressources pour nous accompagner dans cette opération afin de neutraliser les parasites susceptibles d'attaquer les jeunes plantes. Au cours de cette opération, il s'agissait d'appliquer le Lamidacot 90 EC et le Pacha 35 EC. A l'aide des pulvérisateurs, l'ensemble des plants mis en terre ont effectivement été traité. Le contrôle et la supervision des opérations a été assuré par le chargé du reboisement 1400, le délégué d'agriculture et l'animateur communal AGIRAP/PNDP

### **III.4. Opération de regarni**

Au cours des opérations de sécurisation de protection des plantes mis en terre dans le cadre du projet Reboisement 1 400, nous avons identifié près de 1500 plants asséchés. Aussi le rapport fourni par les équipes de gardiennages après plus de trois semaines de travail ont aussi identifié environ 874 plants mort. Ainsi sur la base de ses données que nous avons lancé les opérations de regarni. Pour ce faire la pépinière de Bengui disposait encore plus de 5 000 plants qui avaient été réservé pour cette opération. De fait, huit (08) manœuvres ont été mobilisé pour remplacer les plants mort. Au total, 2350 plants ont été immédiatement remplacé sous le suivi permanent du chargé du reboisement et l'équipe technique d'african commodities qui accompagne la commune de Lagdo dans la mise en œuvre de ce projet.



### III.5. Suivi des opérations sur le terrain

Durant l'opération d'arrosage en ma qualité de chargé de reboisement, j'ai effectué 27 descentes terrain sur les Trois premier mois afin de s'assurer de l'effectivité des travaux sur le site de Bengui. Il était question au cours du suivi s'assurer le bon déroulement de l'arrosage, le regarni et le traitement des plants.



### III.6. Opération d'arrosage des plantes

Ayant débuté deux semaines après la mise en terre des plants, les opérations d'arrosage ont mobilisé deux grands groupes dont l'un constitué de 10 manœuvres volontaires et le second de 15 manœuvres volontaires. Au cours de cette opération 19 femmes et 06 hommes ont été retenus pour cette opération durant 06 mois allant de Septembre à Mars. Comme matériel de travail, un tricycle chargé d'une cuve de 10 000 litre assurait le ravitaillement en eau au niveau de chaque bloc. 05 motopompe assurait l'extraction de l'eau à partir des différents points d'eau construit. Les manœuvres retenus étaient munis des bidons de 20 litres et des arrosoires pour arroser les plantes. Cette opération d'arrosage se faisait 03 fois par semaine et allait de 06 heures du matin à 12 heures et reprenait à 15 heures pour boucler à 17 heures 30. Au terme d'une journée de travail chaque manœuvre percevait par jour un montant de 2000 F CFA payé chaque fin du mois.



### **III.7. Traitement des plants**

Dans le but de faire face aux attaques contre les insectes, les termites et les criquets, nous avons lancé une vaste campagne de traitement des 20 000 plants d'anacarde mis en terre dans le site de Bengui. A cet effet le Délégué d'Arrondissement d'Agriculture et du Développement Rural de Lagdo et avec le concours de l'équipe technique d'African Commodities ont mis à notre disposition 05 personnes ressources pour nous accompagner dans cette opération afin de neutraliser les parasites susceptibles d'attaquer les jeunes plantes. Au cours de cette opération, il s'agissait d'appliquer le Lamidacot 90 EC et le Pacha 35 EC. A l'aide des pulvérisateurs, l'ensemble des plants mis en terre ont effectivement été traité. Le contrôle et la supervision des opérations a été assuré par le chargé du reboisement 1400, le délégué d'agriculture et l'animateur communal AGIRAP/PNDP

### **III.8. Opération de regarni**

Au cours des opérations de sécurisation de protection des plantes mis en terre dans le cadre du projet Reboisement 1 400, nous avons identifié près de 1500 plants asséchés. Aussi le rapport fournit par les équipes de gardiennages après plus de trois semaines de travail ont aussi identifié environ 874 plants mort. Ainsi sur la base de ses données que nous avons lancé les opérations de regarni. Pour ce faire la pépinière de Bengui disposait encore plus de 5 000 plants qui avaient été réservé pour cette opération. De fait, huit (08) manœuvres ont été mobilisé pour remplacer les plants mort. Au total, 2350 plants ont été immédiatement remplacé sous le suivi permanent du chargé du reboisement et l'équipe technique d'african commodities qui accompagne la commune de Lagdo dans la mise en œuvre de ce projet.

### **III.9. Suivi des opérations sur le terrain**

Durant l'opération d'arrosage en ma qualité de chargé de reboisement, j'ai effectué 27 descentes terrain sur les Trois premier mois afin de s'assurer de l'effectivité des travaux sur le site de Bengui. Il était question au cours du suivi s'assurer le bon déroulement de l'arrosage, le regarni et le traitement des plants.

## **IV. REBOISEMENT DE LA BERGE OUEST DU LAC DE LAGDO A OURO-TCHAIDO**

### **IV.1. Réunion de sensibilisation des populations sur reboisement 1400**

Après avoir remercié le Hardo de Ouro-Tchaido (Chef du village) et les communautés pour leur présence massive à cette réunion marquant le lancement des opérations de reboisement du projet « REBOISEMENT 1400 », le le Chargé du reboisement a tenu rappelé aux populations que ce grand projet est une initiative financé par l'Union Européenne et donc l'ACFCAM est le Maître d'ouvrage délégué, CTFC qui est Maître d'œuvre en charge des différentes activités du projet et enfin la commune de Lagdo (qui cofinancent les activités) agi en qualité de maîtres d'œuvre délégués. Par la suite, il rappelé que le projet vient reboiser les berges Ouest du lac en renforçant ceux effectués par le PNDP dans le cadre du projet pilote REDD+. Il s'agira cette fois de reboiser en appliquant le dispositif en quinconze et remplacer par la même occasion les plants mort, assuer l'entretien et mettre en place des pare-feu.



**Photo 7: Sensibilisation des populations sur le**

Après avoir présenté cet état de lieu, il a rappelé que toutes les populations du village sans distinction de sexe ou de race sont conviées à cette opération. Par la suite a informé les populations que 197 hectares feront l'objet d'un renforcement et de regarni soit 19 700 plants forestiers.

### **IV.2. Mot du Chef du village de Ouro-Tchaido**

Dans sa prise de parole, le chef du village de Ouro-Tchaido sa majesté BOUBAKARY Souleymanou a salué les efforts consentis par la commune de Lagdo et l'Union Européenne à travers l'ACFCAM et CTFC pour l'amélioration des conditions écologiques de sa localité à travers ce reboisement qui va non seulement réduire l'ensablement du lac mais aussi et surtout l'amélioration de la qualité de l'air, la stabilisation de l'érosion, la lutte contre le changement climatique et l'avancée du désert. Par la suite, avec beaucoup d'autorité, il a demandé aux



populations de s'investir non pas seulement à la mise en terre des plants mais aussi à la réussite totale de cette activité partant de la mise en terre jusqu'à la surveillance des plants car le développement de ses plantes permettra aux générations futur d'en bénéficier

### **IV.3. Opération de trouaison**

En date du 14 Juin 2019 les opérations de trouaisons ont été lancées dans les villages Ouro-Tchaido le long de la berge du lac. Durant 08 jours intense de travail, 128 hectares ont été troués soit 12 800 trous. Environ 19 manoeuvres ont pris part à cette opération dont 12 femmes et 13 hommes. En date du 22 Juin les opérations de trouaison se sont terminées avec la confection des autres 6 900 trous. Pendant cette période j'ai effectué 05 descentes de suivi des opérations de trouaison sur le terrain.

Il était essentiellement question au cours des descentes de terrain de :

- ✚ S'assurer que les dimensions des trous respectent les normes retenues (40 cm x 40 cm);
- ✚ s'assurer de l'implication des femmes dans cette activité.
- ✚ D'évaluer l'état d'avancement des travaux sur le terrain ;



**Photo 8: Confection des trous**

### **IV.4. Transport et manutention des plants**

Les opérations de transport et de manutention des plants vers le site de reboisement ont débuté 23 Juin 2019. A cet effet 08 volontaires ont été retenus pour les travaux de manutention (chargement et déchargement) de fait, 9 700 plants forestiers ont été transporté de la pépinière municipale pour la localité de Ouro-Tchaido sur une distance de 18 kilomètres. Les 10 000 autres plants acquisent auprès des pépiniéristes privés ont été transportés soit 6 000 plants chez le pépiniériste RIH Nguéri, 1 550 chez ALHADJI Mahamat, 1 250 chez HAPSATOU Doudou et 1 200 chez WASSA Somna. Au total 19 700 plants ont été transporté sur le site à reboisé.





**Photo 9: Manutention et transport des plants auprès des pépiniéristes privés**

Au cours de cette activité, nous avons utilisé un tricycle pour le transport des plants d'une capacité de 500 plants/tour. Au terme de cette activité, les chargé de la manutention ont perçus un montant total de 570 000 F payé en deux tranches tous les samedi.

**IV.5. Mise en terre des plants**

Les opérations de mise en terre des plants ont débutés en date du 17 Juin 2019. Pour ce faire, 15 manœuvres ont été retenus pour les travaux donc 09 femmes et 06 hommes. Au treme des deux dernières semaines du moi de Juin, près de 7600 plants ont été mis en terre sur une superficie de 60 hectares.





Lors des deux premières semaines du mois de juillet, 11 250 plants ont été mis en terre sur une superficie évaluée à 105 hectares. Il faut aussi de même signaler que ce léger décalage des superficies est lié au fait que sur certains espaces jugés importants, nous avons fait des reboisements systématiques couvrant une superficie de 13 hectares. Les 850 autres plants ont été mis en terre en début de la troisième semaine du mois de juillet et les manœuvres ont chacun en ce qui le concerne perçus le reste de leur paiement. De fait durant les travaux le chargé du Reboisement a effectué 16 descentes de terrain pour le suivi régulier des activités sur le terrain et au pointage des manœuvres après les travaux.

#### **IV.6. Destruction des sachets plastiques**

Après chaque journée de travail, les sachets sont collectés et déposés dans un endroit loin des espaces reboisés avant d'être brûlés.



**Photo 10: Destruction des sachets**



#### **IV.7. Paiement des opération de trouaison et de mise en terre des plants**

En date du 07 juillet 2019, le Chargé du Reboisement 1400 a procédé au paiement des frais de trouaison et de mise en terre des plants le long de la berge Ouest du lac de Lagdo dans la localité de Ouro-Tchaido.



**Photo 11: Paiement des opérations de reboisement**

#### **IV.8. Divagation du bétail sur les espaces reboisés**

En date du 09 juillet 2019 une descente sur le site de Ouro-Tchaido a été organisé avec l'appui du service d'hygiène pour arrêter les animaux en divagation sur les espaces reboisés. au cours de cette activité, 09 chèvres ont été capturer et remis au chef du village. A cette occasion le chargé du reboisement a saisi cette opportunité pour sensibiliser d'avantage des population et a relacher les animaux qui ont été immédiatement été conduit dans les enclos.



**Photo 12: Saisie des chaèvres en divagation dans les espaces reboisés**

## **V. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES**

- ✚ Accès très difficile sur le site à reboisé lié aux eaux de ruissellement ;
- ✚ Impossibilités de manœuvre de remplir les fiches de présences et de décharge ;
- ✚ Divagation du bétail sur les espaces reboisés ;
- ✚ Descente pour la capture du bétail sur les espaces reboisés
- ✚ Présence des reptiles (Serpents) sur les sites à reboisé et les pépinières.
- ✚ Transport des plants vers les espaces à reboiser ;
- ✚ Inondation des pistes ;
- ✚ Pluie diluvienne ;
- ✚ Mauvais état de route.

## **VI. SOLUTIONS ENVISAGÉES**

- ✚ Une note a été signée par le Maire de la commune de Lagdo interdisant les animaux en divagation sur le territoire (Confert annexe) ;
- ✚ Organisation des réunions de sensibilisation à travers le porte à porte par le chargé du reboisement sur la divagation du bétail et des petit ruminants ;

Parvenus au terme de la mise en oeuvre des activités durant cette période de mise en oeuvre des activités, deux grandes activités ont été réalisées dans la commune de Lagdo notamment le piquetage des espaces retenus dans le massif forestier de Ouro-Doukoudjé dans la localité de Bengui et le reboisement de 197 hectares dans la localité des Ouro-Tchaido. Aussi, ses opérations étaient associées aux activités transversales telles que les réunions de sensibilisation sur la VIH/SIDA et la viabilité environnementale. Ses différentes opérations ont vu la participations de plus de 60 manoeuvres volontaires constitués de 65% de femmes et 35% des hommes. Les rémunérations perçues par les populations à l'issue des tâches effectués ont permis a certain d'entre eux de s'offrir des semences pour la campagne agricole, des herbicides pour le traitement des champs et de subvenir au besoin alimentaire quotidien.

Activités	Sous-Activités	Input	Dépenses prévues (FCFA)	Dépenses réelles	Contribution de la commune	Reliquats	Observations
<b>Composante 2: Reboiser 1 000 hectares dans les communes du Nord et de l'Extrême Nord.</b>							
<b>2.13 Préparer le terrain et mettre les plants en terre</b>	Acquérir le matériel pour la préparation du terrain ;	Achat pot de peinture(1kg)	30 000	30 000	0	0	
		Machettes (10)	30 000	30 000	0	0	
		Ficelle (100 m)	40 000	40 000	0	0	
		Diluant	20 000	20 000	0	0	
		Gans (10 paires)	10 000	10 000	0	0	
		Pinceaux (10)	10 000	5 000	0	5 000	Le montant a été surévalué
		Décamètre (04)	80 000	80 000	0	0	
	Défricher la parcelle à reboiser	Défrichage	1 000 000	1 000 000	0	0	
	Rechercher les jalons et confection des piquets	Confection des Piquets	500 000	500 000	0	0	
		Transport des piquets	20 000	20 000		0	
Effectuer le piquetage des espaces retenus	Piquetage	1 000 000	1 000 000		0		
Sensibiliser les populations sur la viabilité environnementale et la lutte contre le VIH/SIDA	Prise en charge Formateur	90 000	90 000	0	0		
<b>Suivi des activités</b>	Carburant + Vidange moto Yamaha AG100 CR1400				145 800	0	
	<b>Sous Total 1</b>		<b>2 830 000</b>	<b>2 825 000</b>	<b>145 800</b>	<b>5 000</b>	
<b>TOTAL : 2 970 800 F CFA</b>							
<b>Reboisement de la berge ouest du lac de Lagdo</b>	Confection des trous	19 700 trous	985 000	985 000	0	0	
	Acquisition des plants forestier	19 700 plants	1 000 000	1 000 000	970 000	0	
	Mise en terre des plants	Transporter les plants vers les espaces à reboiser	270 000	273 000	0	-3000	Le montant sous évalué
		Manutention des plants	591 000	591 000	0	0	
		Plant mis en terre	985 000	985 000	0	0	
	Surveillance et entretien des plants	Motivation des gardiens	300 000	300 000	0	0	En cours de réalisation
		Mise en place des pare-feu	100 000	100 000	0	0	Activité non encore réalisée
<b>Suivi des activités</b>	Carburant + Vidange moto Yamaha AG100 CR1400				163 600		
	Salaire Chargé du reboisement	6 mois de salaire (Janvier à Juin 2019) soit 350 000 F/mois			2 100 000		
	<b>Sous Total 2</b>		<b>4231 000</b>	<b>4 234 000</b>	<b>3 233 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>TOTAL : 7 467 000 F CFA</b>							
<b>Opération de trouaison</b>	Confection des Trous	20 000 trous	2 000 000	2 000 000	0	0	
	Acquisition des plants	Pioche	50 000	50 000	0	0	

		Barre à mine	100 000	100 000	0	0		
		Pelle bêche	60 000	60 000	0	0		
	Sensibilisation des parties prenantes sur la promotion des droits et l'égalité entre les hommes et les femmes	Prise en charge personne ressource	45 000	45 000	0	0		
<b>Suivi des activités sur le terrain</b>	Carburant chargé du reboisement+ Vidange		0	0	120 500	0		
	<b>Sous Total 3</b>		<b>2 255 000</b>	<b>2 255 000</b>	<b>120 500</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL : 2 375 500 F CFA</b>								
<b>Réunion de sensibilisation des autorités administratives et traditionnelles, OSC, associations...</b>	Forfait transport participant	90 participants	970 000	970 000	0	0		
	Pause déjeuner+Repas+Raffraichissant	90 participants	351 000	351 000	0	0		
	Matériels de sensibilisation des pp	Kit des participants		90 000	90 000	0		
		Banderolles		50 000	50 000	0		
		Roll-Up		60 000	60 000	0		
		Location de la salle		0	0	50 000		
		Location vidéo projecteur		0	0	20 000		
		Impression et Reprographie des documents		0	0	100 000		
	Communication sur les activités du projet	Confection des T-Shirt (Polo)		300 000	300 000			
		Confections des affiches grand format (A0)		75 000	75 000			
		Achat colle à papier		8 000	8 000			
		Frais de déplacement pour affichage		0	0	50 000		
		Sonnorisation		0	0	50 000		
	Couverture Médiatique	CRTV Télé et Radio		80 000	80 000	0		
		Canal 2		50 000	50 000	0		
Œil du sahel (presse)			30 000	30 000	0			
	<b>Sous Total 4</b>		<b>2 064 000</b>	<b>2 064 000</b>	<b>270 000</b>			
<b>TOTAL : 2 334 000</b>								
<b>Mise en terre des plants</b>	Formation sur les techniques de reboisement	Organiser une formation	40 000	40 000	0			
	Transport des plants vers les espaces à reboisés	Transporter 20 000 plants	320 000	320 000	0			
	Manutention des plants (Chargement/Déchargement)	Manutention de 20 000 plants	600 000	600 000	0			
	Location tricycle	02 tricycle disponible	0	0	400 000			

	Mise en terre	20 000 plants mis en terre	1 000 000	1 000 000	0		
	Acquisition du matériel	Acquisition des brouettes	115 000	115 000	0		
		Achat des engrais	400 000	400 000	0		
	Sensibilisation des parties prenantes sur les droits de l'enfant et des peuples autochtones	Prise en charge personne ressource	45 000	45 000	0		
	Réalisation d'un documentaire sur les activités du projet	Prise en charge caméraman	60 000	60 000	30 000		
<b>Suivi des activités sur le terrain</b>	Carburant chargé du reboisement+ Vidange		0	0	157 200		
	<b>Sous Total 5</b>		<b>2 565 000</b>	<b>2 565 000</b>	<b>587 200</b>		
<b>TOTAL : 3 152 200 F CFA</b>							
<b>Organiser et gérer l'entretien, le suivi et la sécurisation des nouvelles plantations</b>	Acquisition du matériel de protection des plants	Machettes de désherbage	45 000	45 000	0		
		Achat des houes	45 000	45 000	0		
		Achat des Limes	30 000	30 000	0		
	Main d'œuvre pour la protection et gardiennage des jeunes plants	Création du pare-feu extérieur et intérieur	1 848 000	1 848 000	0		
		Tour des plants	1 000 000	1 000 000	0		
		Confection des tenues pour gardien	75 000	75 000	0		
		Motivation gardien	900 000	600 000		300 000	
	Réunion de sensibilisation des populations	Sensibilisation sur les feux de brousse et la divagation du bétail	75 000	75 000	0		
Sensibilisation sur la démocratie		45 000	45 000	0			
<b>Suivi des activités sur le terrain</b>	Carburant chargé du reboisement	Contribution commune	302 000		302 000		Le carburant du CR 1400 est pris en charge par la commune
	Vidange moto Yamaha AG100	Contribution commune	31 200		31 200		
	<b>Sous Total 6</b>		<b>4 063 000</b>	<b>3 763 000</b>	<b>333 200</b>	<b>300 000</b>	
<b>TOTAL : 4 063 000 F CFA ; ACFCAM (Dépense Réelles) 3 763 000 F CFA ; Reste à justifier 300 000 F CFA</b>							
<b>Organiser les opérations d'arrosage des plants</b>	Construction de 05 points d'eau artisanaux	05 points d'eau construit	300 000	300 000	0	0	
	Arroser les plantes	20 000 Plants arrosés	2 400 000	800 000		1 600 000	
	Carburant de tricycle pour transporter de l'eau	Carburant livré	1 890 000	787 500		1 102 500	
	Location tricycle	02 tricycles opérationnelles	0	0	960 000		
	Carburant pour motopompe	Carburant livré	453 600	296 100		157 500	

	Motopompe + Accessoires	Motopompe + Accessoires disponible	0	0	425 000	0	
	Acquisition des bidons de 20 Litres	50 Bidons de 20 L disponible	125 000	125 000		0	
	Arrosoirs	Arrosoirs disponible	0	0	90 000	0	
<b>Traitement Phytosanitaires des plants</b>	Achat du pacha 35 EC	Pacha 35 EC disponible	200 000	200 000		0	
	Achat du lamidacot 90 EC	Lamidacot 90 EC disponible	240 000	240 000		0	
	Achat des pulvérisateurs	Pulvérisateurs disponible	75 000	75 000		0	
	Cache nez	Cache nez disponible	20 000	20 000		0	
	Gants en plastique	Gants en plastique disponible	30 000	30 000		0	
	Mains d'œuvre des manœuvres	Mains d'œuvre des manœuvres disponible	1 000 000	1 000 000		0	
<b>Opération de regarni</b>	Main d'œuvre regarni	Regarni	101 800	101 800		0	
	Carburant transport des plants	Carburant livré	149 940	149 940		0	
<b>Suivi des opérations sur le terrain</b>	Carburant Chargé du reboisement		0	0	236 250		
	Vidange moto AG 100		0	0	41 600		
	<b>Sous Total 7</b>		<b>6 985 340</b>	<b>4 125 340</b>	<b>1 752 850</b>	<b>2 860 000</b>	
<b>TOTAL : 6 985 340 F CFA ; ACFCAM (Dépenses Réelles) : 4 125 340 F CFA ; Reste à justifier 2 860 000 F CFA</b>							
<b>Opération d'arrosage dans le cadre du reboisement de la berge du lac sur 197 ha</b>	Arroser les plants	Plants arrosés	800 000	160 000	0	640 000	
	Carburant de tricycle pour transporter de l'eau	Caburant disponible	315 000	157 500	0	158 000	
	Carburant pour motopompe	Caburant disponible	252 000	138 600	0	113 400	
	Location tricycle	Ticycle disponible	0	0	400 000		
	Motopompes+Accessoires		0	0	170 000		
<b>Surveillance et entretien</b>	Confection des tenues des gardiens		75 000	0	0	75 000	
	Motivation des gardiens	05 gardiens mis en place	625 000	250 000	0	375 000	
	Sensibilisation sur les feux de brousses et divagation du bétail	Réunion organisée	45 000	45 000	0	0	
<b>Suivi des opérations sur le terrain</b>	Carburant Chargé du reboisement		0	0	100 800		
	Vidange moto AG 100		0	0	20 800		
	Salaire Chargé du Reboisement 1400	salaire (Juillet à Décembre 2019) 350 000 F/mois	0	0	2 100 000		
	<b>Sous Total 8</b>		<b>2 112 000</b>	<b>751 100</b>	<b>2 791 600</b>	<b>1 361 400</b>	
<b>TOTAL : 2 112 000 F CFA ; ACFCAM (Dépenses Réelles) : 751 100 F CFA ; Reste à justifier 1 361 000 F CFA</b>							
<b>TOTAL GLOBAL : ACFCAM : 22 584 440 F CFA ; CONTRIBUTION COMMUNE : 9 233 350 F CFA ; RESTE A JUSTIFIER : 4 521 400 F CFA</b>							





**COMMUNIQUE RADIO/PRESSE N°...../CRP/CLDO/2019**

Le Maire de la Commune de Lagdo communique :

La divagation des animaux domestiques (chèvres, moutons, bœufs, ânes, chevaux, porcs ...) est interdite sur l'étendue du ressort territorial de la Commune de Lagdo.

Par conséquent, tout animal trouvé errant sur la voie publique ou sur tout autre lieu public sera arrêté et mis en fourrière conformément à la réglementation en vigueur.

A cet effet, il invite les propriétaires des ces animaux à les garder dans des enclos appropriés ou de les mettre à la disposition d'un berger.

**AMPLIATIONS :**

- SOUS-PREFET/ LDO
- SERVICE D'HYGIENE
- RECETTE MUNICIPALE
- TOUS LES CHEFS DE VILLAGE
- AFFICHAGE
- CHRONO-ARCHIVES

FAIT A LAGDO, LE 03/07/2019



*Rama Mbakai*

